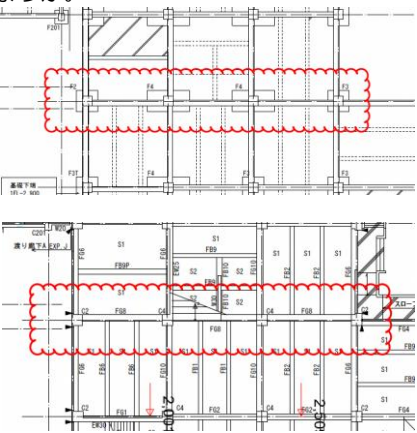
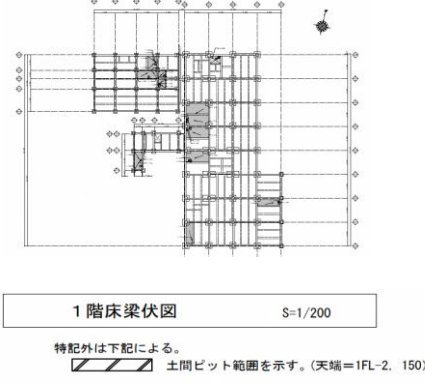


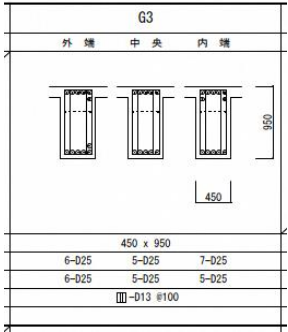
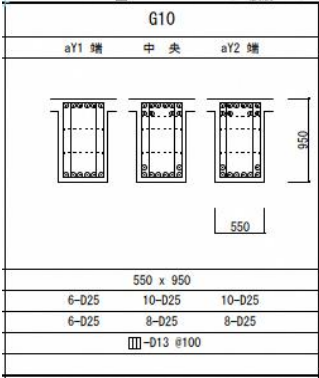
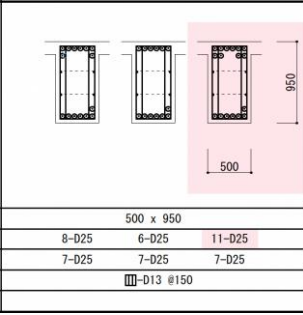
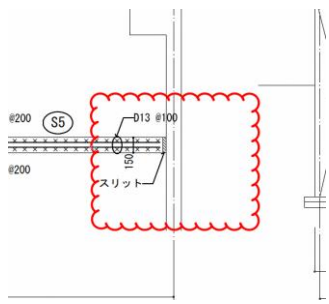
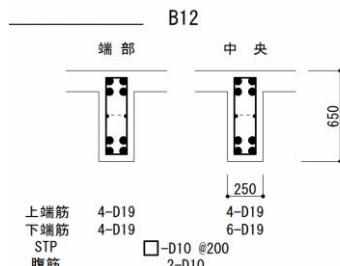



番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
		【新設共通】	
		(躯体)	
1	A12-020 C12-003	土工事に於ける掘削開始レベルについて、各図面より造成後地盤レベル(131.277)=設計GL(131.277)とし、設計GLより掘削開始と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
2		山留含む土工計画があれば御指示下さい。 オープン掘削にて考えるとして良いでしょうか。	土工計画図はございません オープン掘削として考えてよろしいですが、2期工事で近接している校舎の解体工事があるため、埋め戻す際、基礎解体時に埋戻し土が崩れてこないように配慮は必要です 設計では校舎A、渡り廊下A、Bの埋戻土を購入土として見込んでいます 根切土を改良して埋戻土としても構いません
3	ST-001	地業工事に於いて、下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 捨てコンクリート:Fc18 S15 砂利地業:再生クラッシャーラン	よろしいです
4	ST-001	2.使用構造材料に於いて、設備基礎のコンクリート強度について、接する床のコンクリート強度と同様と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
5	ST-001	押えコンクリート、嵩上げコンクリートのコンクリート強度について、Fc18 S15と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
		【校舎(A)】	
		(躯体)	
6	S-12-001	杭伏図、杭リスト、杭頭補強リストに於いて、杭符号P1、P2、P3について、上杭(SC杭)の鋼管の厚みがt=14となっておりますが、クラウンパイルアンカー 杭頭詳細図にて杭鋼管厚さ:16mm以上と記載がございます。 杭リストを正とし、積算上はt=14と考えて宜しいでしょうか。	t = 14でよろしいです



番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
7	S12-002 S12-003	基礎・ピット伏図と1階床梁伏図に於いて、aY3付近のFG8の位置が相違しております。 基礎・ピット伏図の位置を正として宜しいでしょうか。 	よろしいです
8	S12-002 S12-015 A12-015	基礎・ピット伏図に於いて、土間ピットの天端が1FL-2150となっておりますが、意匠図上では水勾配がついております。 土間ピットに増し打ちを見込むと考えると宜しいでしょうか。  1階床梁伏図 S=1/200 特記外は下配による。 土間ピット範囲を示す。(天端=1FL-2, 150)	よろしいです
9	ST-003	上記に関連して、配筋基準図にスラブの増し打ち補強要領が見当たりません。 スラブに増し打ちを見込む場合、打増補強は下記画像の通りの配筋とし、t50以上より見込むと考えると宜しいでしょうか。  図13-3-2 スラブの打増し要領	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
10	S12-010	基礎リストに於いて、下記符号のつなぎ筋ピッチの記載が見当たりません。 すべてD13@300と考えて宜しいでしょうか。 ・ F1 ・ F2 ・ F2A ・ F2B ・ F3 ・ F3A ・ F3T	よろしいです
11	S12-011	基礎梁リストに於いて、FCG2,FCG2Aの断面図の腹筋本数が特記外仕様と相違しております。断面図を正とし、下記仕様と考えて宜しいでしょうか。 ・ FCG2:4-D13 ・ FCG2A:6-D13 	よろしいです
12	S12-011	基礎小梁リストに於いて、下記符号の腹筋本数が断面図と特記外仕様で相違しております。すべて断面図を正として宜しいでしょうか。 ・ FB1 ・ FB2 ・ FB5	よろしいです
13	S12-011 A12-015	通気管、通水管の補強要領について、梁貫通補強リストに記載がありません。 積算上孔際STP筋を両側に2か所ずつ見込むと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
14	S12-014	大梁リストのG3に於いて、R階の腹筋本数が断面リストと特記外仕様で相違しております。 断面図を正とし、2-D10と考えて宜しいでしょうか。 	4-D10としてください
15	S12-014	大梁リストのG10に於いて、端部位置がaY1端・aY2端と記載がありますが、伏図上に該当する端部になるG10が見当たりません。 aY1をaX1、aY2をaX2にそれぞれ置き換える と考えて宜しいでしょうか。 	よろしいです
16	S12-014	大梁リストのG12に於いて、上端筋の本数が断面図とリストで相違しております。 リストを正とし、10-D25として宜しいでしょうか。 	11-D25としてください

番号	図面番号	質問事項	御回答
17	S12-016	上記に関連して、階段2の踊り場・壁間のスリットの詳細が見当たりません。 完全スリット・水平20x150・耐火型と考えて宜しいでしょうか。 	よろしいです
18	S12-016	階段配筋図のB12に於いて、中央下端筋の本数が断面図とリストで相違しております。 リストを正とし、6-D19として宜しいでしょうか。 	4-D19としてください
19	A12-021～ A12-026	【校舎】矩計図に於いて、型枠デッキと記載がありますが、構造図には詳細が見当たりません。 構造図を正とし、在来型枠と考え型枠デッキは使用しないと考えて宜しいでしょうか。	人手不足、工期の短縮を踏まえ、近年要望の多い型枠デッキを採用できるよう構造上も考慮しており、設計書（参考）でも計上しています。 上記などの懸念事項が問題ないようでしたら、在来型枠として考えていただいて結構です。 採用・不採用のどちらも選べるように構造図には記載せず、意匠図のみに記載しています。
20		上記質疑が否の場合、デッキの仕様、適用範囲を御指示下さい。	デッキの仕様は施工者選定でよろしいです 範囲は全てで考えていましたが、施工者判断で決定していただいて構いません
21	A12-031 S12-016	断面詳細図に於いて、下図の通り階段がござい ますが配筋詳細図が見当たりません。 階段1の配筋と同様と考えて宜しいでしょうか。 	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
22	A12-023	キャンピー鉄骨は3期工事に該当するため、1期工事に含まれます柱脚アンカーボルト、ガセットプレート用アンカーボルトのみ計上しておくと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
		【校舎(B)】	
		(躯体)	
23	S12-002 S12-009 S12-019	校舎B棟の柱キープランに於いて、bX2通りの柱の配置が伏図、軸組図と相違しています。伏図、軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
24	S12-015	校舎B棟の釜場の配筋詳細が見受けられません。校舎A棟の消火水槽のものと同じ配筋と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
25	S12-018	基礎リストに於いて、つなぎ筋の詳細な記載が見受けられません。D13@300と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
26	S12-018 A12-015	通気管、通水管の補強要領について、梁貫通補強リストに記載がありません。積算上孔際STP筋を両側に2か所ずつ見込むと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
27	A12-021～ A12-026	【校舎】矩計図に於いて、型枠デッキと記載がありますが、構造図には詳細が見当たりません。構造図を正とし、在来型枠と考え型枠デッキは使用しないと考えて宜しいでしょうか。	人手不足、工期の短縮を踏まえ、近年要望の多い型枠デッキを採用可能としました。構造上も考慮しており、設計書（参考）でも計上しています。上記などの懸念事項が問題ないようでしたら、在来型枠として考えていただいて結構です。採用・不採用のどちらも選べるように構造図には記載せず、意匠図のみに記載しています。
28	A12-129	風除室 ポーチ詳細図のC断面詳細図に於いて、配筋の記載が見受けられません。D13@200ダブル(縦・横)と考えても宜しいでしょうか。	よろしいです
		【渡り廊下(A)】	
		(躯体)	

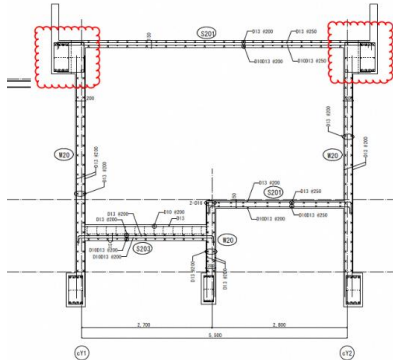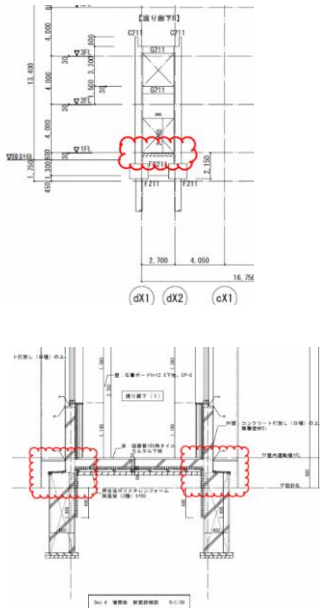番号	図面番号	質問事項	御回答
29	S-12-001	杭伏図、杭リスト、杭頭補強リストに於いて、杭符号P202について、上杭(SC杭)の鋼管の厚みが $t=9$ となっておりますが、クラウンパイルアンカー 杭頭詳細図にて杭鋼管厚さ:12mm以上と記載がございます。 杭リストを正とし、積算上は $t=9$ と考えて宜しいでしょうか。	$t=9$ でよろしいです
30	S12-005 A12-203	渡り廊下 壁リスト、床板リストに於いて、梁側面に300mm程の増し打ちの記載が見受けられますが、3階伏図にはありません。渡り廊下 壁リスト、床板リストを正として考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
			
31	S12-009 A12-210	基礎梁上のフカシ部分の記載が構造図と意匠図で相違しています。構造図を正として考えて宜しいでしょうか。	構造図を正としてよろしいです
			
32	S12-201	基礎リストに於いて、つなぎ筋の詳細な記載が見受けられません。 D13@300と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです

番 号	図面番号	質 問 事 項	御 回 答
33	S12-201	基礎梁リストに於いて、FG202,FG203の断面に吊筋の記載が見受けられますが、詳細が見受けられません。 D10@1000と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
		【渡り廊下(B)】	
		(躯体)	
34		1階床梁伏図に於いて、壁符号EW18が見受けられますが、リストに記載がありません。 EW18について、t180、配筋はEW15に倣うと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
		【解体取り合い改修工事 渡り廊下】	
		(躯体)	
35	A11-018	解体取り合い部分詳細図(渡り廊下)(3) RC壁新設に於いて、新設壁のコンクリート強度について積算上はFc24 S15と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです (Fc21+3 S15)
36	A11-018	解体取り合い部分詳細図(渡り廊下)(3) RC壁新設に於いて、既存躯体面に目荒らしを見込むと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです
37	A11-018	解体取り合い部分詳細図(渡り廊下)(3) RC壁新設に於いて、あと施工アンカーについて積算上は埋込深さ8D、定着長さ20D程度と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです (接着系アンカーとする)
