


五戸町緊急浚渫推進事業計画

令和2年度 緊急浚渫推進事業計画（河川）				
市区町村名 五戸町 河川名 五戸川水系堤沢川（準用河川） <small>（普通河川は、管理されている名称・番号等でも可）</small> 担当課室名 建設課土木班 連絡先 0178-62-2111				
事業名	五戸川水系堤沢川緊急浚渫推進事業			
事業の内容 <small>（浚渫箇所（所在地））</small>	五戸町が管理する五戸川水系堤沢川（準用河川）の堆積土砂掘削を行うもの。 浚渫予定箇所：青森県五戸町大字倉石石沢地先 【別図参照】			
実施予定期間	令和2年度（1年間） <small>※各年度の個別記載が困難な場合は、「計」欄（全体予定量）、並びに「事業実施年度」欄（例えば令和2年度欄）の記載のみ可 ※各年度については、記載が可能となった時点で可及的速やかに記載されたい</small>			土質区分 <small>別添「発生土利用基準について」の「土質区分基準」による区分</small>
予定事業量 （各年度の浚渫土砂量） （単位：m ³ ） <small>※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、（m²）書きで記載 ※事業実施にあたり、提出時点で想定される事業量について記載（可能な範囲で記載。変更がある場合には随時変更して差し支えない）</small>	令和2年度	200m ³		第3種建設発生土 ※目視による見込みであり、実際と異なり得る
	令和3年度	0		
	令和4年度	0		
	令和5年度	0		
	令和6年度	0		
	計	200m ³		
予定事業費 （単位：千円） <small>※事業実施にあたり、提出時点で想定される事業費について記載（可能な範囲で記載。変更がある場合には随時変更して差し支えない）</small>		事業費	地方債	一般財源
	令和2年度	2,000	2,000	0
	令和3年度	0	0	0
	令和4年度	0	0	0
	令和5年度	0	0	0
	令和6年度	0	0	0
	計	2,000	2,000	0
事業の必要性、 緊急性 <small>※提出時点で記載可能な範囲で差し支えない</small>	・五戸川水系堤沢川（準用河川）は五戸町南東部を貫流し、倉石石沢地区で五戸川水系二級河川堤沢川に接続する流路延長2.5kmの準用河川であり、流域には住家や農地があり氾濫等が発生した場合の被害は甚大である。 ・堤沢川では、これまでの出水等による土砂流出・堆積により流下能力が低下（流下断面が阻害）されており、現状でもその安全度は十分とは言えない状況にある。 ・令和2年度現在、河道内の土砂堆積量は200m ³ であり、早期の流下能力（断面）確保に努めるとともに、定期的な維持管理が必要である。			
浚渫目標 <small>※提出時点で記載可能な範囲で差し支えない</small>	・令和2年度の1年間で、河川環境に配慮しつつ200m ³ の堆積土砂掘削を行い、河道における流下能力を確保する。			
河道の状態把握 <small>※今後の河川管理の目標（実施、計画）・方針等について、可能な範囲で記載 ※変更がある場合には随時変更して差し支えない</small>	・基本データの収集（雨量）：観測頻度（月1回及び多雨量時）、時期（通年） ・河川巡視：実施場所（全域）、実施頻度（週1回等）、時期（通年）			
その他 <small>※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記載 ※変更がある場合には随時変更して差し支えない</small>	※浚渫箇所や発生土砂量については、現時点の予定であり今後変更があり得る			

* 記述内容に変更がある場合には、適宜変更のうえ提出するものとする。

堤沢川位置図

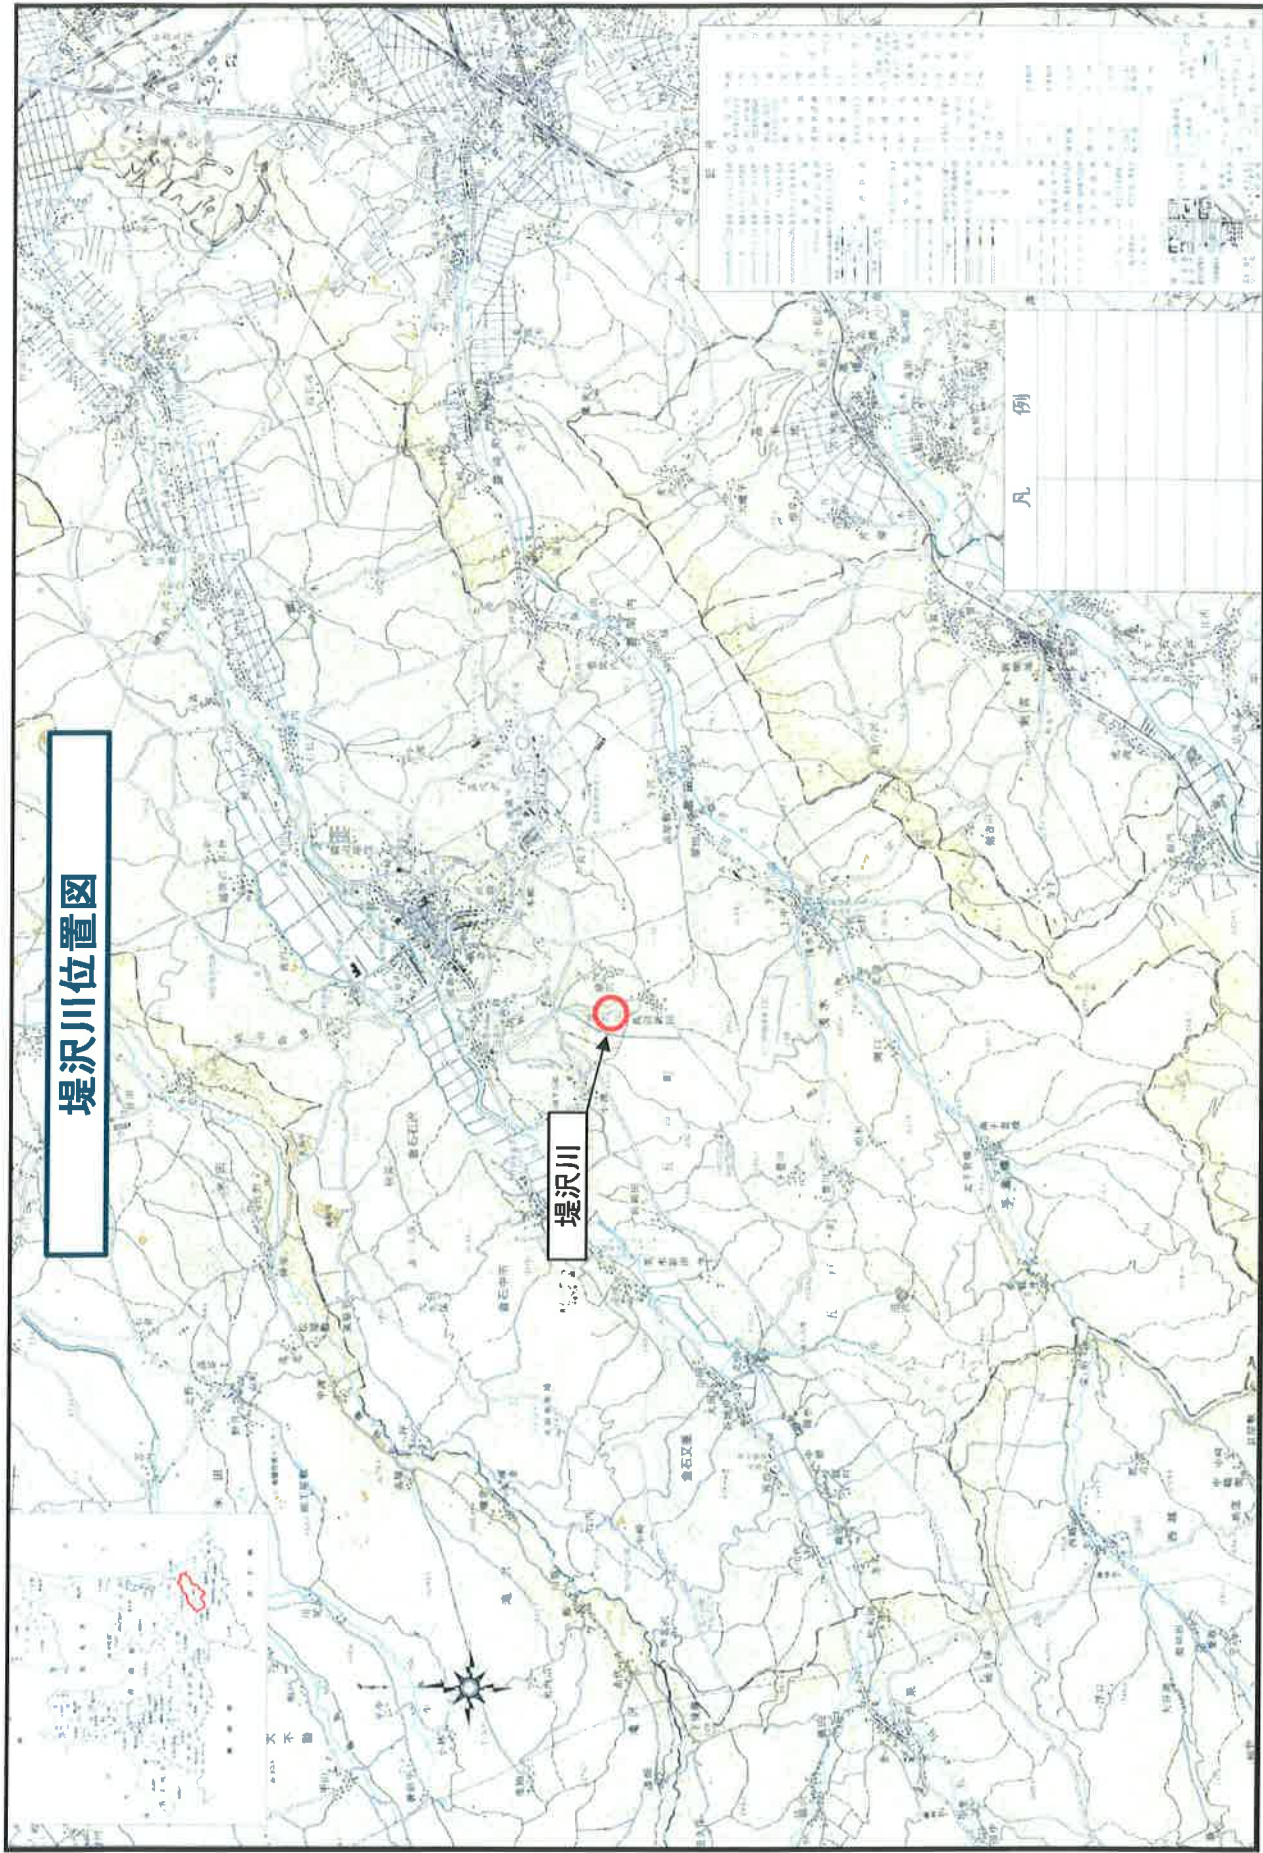

堤沢川

凡例
